



DIF
ESTATAL DE VERACRUZ



Oficio No. D/CREEVER/0441/2014
Asunto: El que se indica
Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2014

"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz"

LIC. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL SEDIF

Atendiendo a memorándum número DFA.094.14 de fecha 19 de noviembre del año en curso emitido por la Dirección de Finanzas y Administración del Sistema estatal DIF, en el cual solicita sea publicada la información de los avances físicos-financieros de la Primera y Segunda Etapa de construcción de los 8 consultorios y adecuación de la sala de Rayos X en este Centro de Rehabilitación, al respecto me permito enviar en anexo dicha información, para que se lleven a cabo las acciones pertinentes y dar cumplimiento a lo establecido en el apartado *COMPROMISO DE LAS PARTES*, del convenio, por lo que ruego a usted sea publicada en la página de internet que tenga disponible este Sistema.

Agradeciendo de antemano sus finas atención, reciba un cordial y afectuoso saludo.

"VERACRUZ, ESTADO PRÓSPERO"

ATENTAMENTE


DR. NELSON PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR

C.C.P. Lic. Astrid Elías Mansur. Directora General del SEDIF. Para su conocimiento.
C.P. Miguel Ángel Ortiz Romero. Dirección de Finanzas y Administración del SEDIF. Para su conocimiento.
L.C. Carlos Mario Luna García. Subdirector de Recursos Financieros del SEDIF. Mismo fin.
C.P. Miguel Ventura Vázquez. Subdirector de Gestión y Control de Recursos del CREEVER. Mismo fin.
Archivo

Nombre del Proyecto
Primera Etapa de la Construcción de 8 consultorios en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa, (Fabricación y Colocación Estructura de Metálica para Forjar Mezzanine.)

Objetivo del Proyecto
Colocación de estructura metálica para forjar mezzanine para construir 8 consultorios en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa, Veracruz, para poder brindar espacios más adecuados de atención a las personas con discapacidad y atenuar la demanda de servicios en los consultorios del Centro de Tecnología Adaptada "CTA", Psicología y terapia ocupacional.

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
✓ Cotización de los materiales y mano de obra para la construcción de mezzanine a base de estructura metálica y cimbraplay de 18 mm	100 %	Proceso de Licitación y adjudicación de la obra a Proveedor a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas
✓ Construcción de mezzanine a base de estructura metálica y cimbraplay de 18 mm de espesor, para desplantar 8 consultorios.	100 %	Obra concluida por el contratista
✓ Suministro e instalación de plafón reticular y luminarias de 0.61 x 0.61 en cubículos existentes.	100%	Obra concluida por el contratista
✓ Recepción de obras de la construcción de mezzanine	100 %	Acta entrega de parte del contratista a DIF Estatal de Veracruz.

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Instrucciones: En este punto se debe especificar con claridad las acciones, equipos, obras, insumos, etc. que se hayan adquirido o efectuado con los recursos asignados. Esta información debe coincidir con la reportada en su proyecto en los puntos correspondientes del 8 al 11 (Tercera parte. Obras y Acciones).				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Fabricación de estructura metálica	\$ 181,823.17	\$ 181,823.17	718	



(vigas y PTR) incluye corte y resanes en muros existentes, colocación y fijación de cimbraplay.				
Colocación de plafón y luminarias.	\$ 66,756.83	\$ 66,756.83	718	
Total	\$ 248, 580.00	\$ 248, 580.00		

Informe Gráfico de Avances

Detalles del Gasto					
Fecha de Factura	Número de Factura	Nombre del Proveedor o Prestador del Servicio	Concepto de Facturas	Obra o Acción en que se usó el Recurso	Importe Total
30/12/2013	718	MARCO ANTONIO CERON TOLEDANO	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 8 CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL(FABRICACION Y COLOCACION ESTRUCTURA METALICA PARA FORJAR MEZZANINE	CONSTRUCCION DE 8 CONSULTORIOS	Importe \$ 248,580.00
Total Recurso Ejercido					\$ 248,580.00
Reintegro					
Total					\$ 248,580.00



Nombre del Proyecto
Segunda y última etapa de la construcción de 8 Consultorios en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa y, adecuación de la Sala de Rayos X del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa.

Objetivo del Proyecto
Realizar la segunda y última etapa de la construcción de 8 consultorios en el centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa. Para brindar espacios más adecuados de atención a las personas con discapacidad y atenuar la demanda de servicios en los consultorios de Centro de Tecnología Adaptada "CTA" Psicología y Terapia Ocupacional. Asimismo, la adecuación física con base en la normatividad para la construcción de un espacio de Rayos X en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa, Veracruz, para poder brindar los espacios más adecuados de atención a las personas con discapacidad y ofrecer servicios de radiología como auxiliar diagnóstico.

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
✓ .- Complemento de mezanine, muros de tabla roca, barras o entrepaños a base de tabla roca, puertas de madera y chapas de seguridad.	100%	Proceso de Licitación y adjudicación de la obra a Proveedor a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas
✓ Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, lavabos y llaves mezcladoras	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ .- Acabados a base de pintura vinílica, ventanas de aluminio persianas enrollables, azulejo en zona de lavabos, piso y zoclo laminado.	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ .- Suministro e instalación de muro a base durock, plafones, de tablaroca, puertas, cancelería, salidas hidrosanitarias y muebles para wc y lavabo, cerraduras, etc.	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ .- Protección de muros y plafón en área de rayos X con placa de plomo y emplomado de puertas.	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ Suministro, instalación y conexión de tableros eléctricos interruptores, cableado y todo lo necesario para la operación de los equipos e iluminación, dos equipos de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU c/u (3 Ton de refrigeración).	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ .-Recepción de todas las obras de la construcción de los 8 consultorios y espacios para rayos X.	100%	Obra ejecutada por el contratista.
✓ .-Traslado de equipo existente, verificación y certificación del blindaje para la protección de	100%	Obra ejecutada por el contratista.



radiaciones.		
✓ .-Beneficiar a 750 personas con discapacidad.	80%	Pacientes beneficiados.
✓ Realizar la comprobación del Proyecto.	100%	Envío de Comprobación de DIF, Nacional.


Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
✓ .- Instalación muros de tabla roca, barras o entrepaños a base de tabla roca, puertas de madera y chapas de seguridad.	\$ 242,235.70	\$ 242,235.70	719	
✓ Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, lavabos y llaves mezcladoras.	\$ 237,066.88	\$ 237,066.88	719	
✓ .- Acabados a base de pintura vinílica, ventanas de aluminio persianas enrollables, azulejo en zona de lavabos, piso y zoclo laminado.	\$ 220,697.42	\$ 220,697.42	719	
✓ .- Suministro e instalación de muro a base durock, plafones, de tablaroca, puertas, cancelería, salidas hidrosanitarias y muebles para wc y lavabo, cerraduras, etc	\$ 422,704.00	\$ 422,704.00	719	
✓ .- Protección de muros y plafón en área de rayos X con placa de plomo y emplomado de puertas.	\$ 98,600.00	\$ 98,600.00	719	
✓ Suministro, instalación y conexión de tableros eléctricos interruptores, cableado y todo lo necesario para la operación de los equipos e iluminación, dos equipos de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU c/u (3 Ton de refrigeración).	\$ 151,096.00	\$ 151,096.00	719	
✓ Traslado de equipo existente, verificación y certificación del blindaje para la protección de radiaciones	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	719	
	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		

Informe Gráfico de Avances

Instrucciones: 8 consultorios



Instalaciones de Rayos X

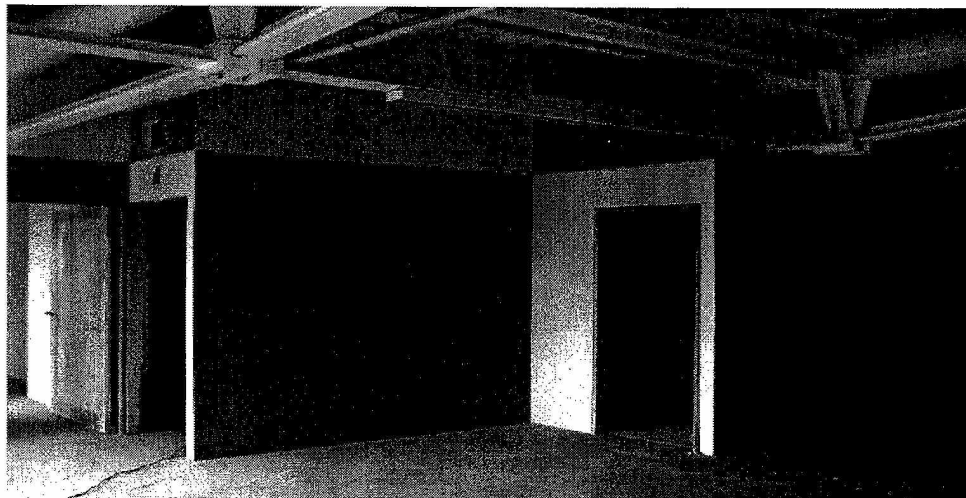

C

Detalles del Gasto					
Fecha de Factura	Número de Factura	Nombre del Proveedor o Prestador del Servicio	Concepto de Facturas	Obra o Acción en que se usó el Recurso	Importe Total
30/12/2013	719	MARCO ANTONIO CERON TOLEDANO	PAGOS DE TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 8 CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL DE XALAPA Y ADECIACION DE LA SALA DE RAYOS X, CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL DE XALAPA, VER.	CONSTRUCCION DE 8 CONSULTORIOS Y ADECUACION DE LA SALA DE RAYOS X	Importe \$ 1,500,000.00
Total Recurso Ejercido					\$ 1,500,000.00
Reintegro					
Total					\$ 1,500,000.00
